

***О результатах мониторинга реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по состоянию на 01.07.2021***

Контрольно-счётной палатой Кировской области в рамках мониторинга национальных (региональных) проектов подведены итоги мониторинга реализации проектов – победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях за I полугодие 2021 г.

В Кировской области с 2019 г. реализуются 3 проекта – победителя всероссийского конкурса с бюджетным финансированием 245 млн. руб.:

- проект *«СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ»* - концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советске Кировской области (признан победителем конкурса в 2019 г.), стоимость проекта – 64,1 млн. руб. (в т. ч. средства федерального бюджета (первоначальные ассигнования) – 60 млн. руб.);

- проект *«ЗАВОДной Омутнинск»* в г. Омутнинске (признан победителем конкурса в 2020 г.), стоимость проекта – 94,6 млн. руб. (в т. ч. средства федерального бюджета – 70 млн. руб.);

- проект *«Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская»* в г. Кирово-Чепецке (признан победителем конкурса в 2021 г.), стоимость проекта – 125,34 млн. руб. (в т. ч. средства федерального бюджета – 80 млн. руб.).


Ни один из проектов в настоящее время не завершён. Их реализация осуществляется с нарушением Графиков, утверждённых Губернатором области и согласованных Минстроем России.

Несвоевременная подготовка проектной документации и невыполнение обязательств подрядчиком привели к тому, что в установленный срок в 2020 г. не завершён проект *«СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ»*. По итогам 2020 г. работы по его реализации были выполнены и оплачены на сумму 26 млн. руб., или 46 % контрактной стоимости. Нарушение сроков выполнения проекта привело к потере софинансирования из федерального бюджета и дополнительным расходам областного бюджета на сумму 29,1 млн. руб.



Администрацией г. Советска по состоянию на 01.07.2021 приняты и оплачены подрядчику работы на сумму 36,8 млн. руб. (65,4 % от цены контракта). На 08.04.2021, по данным министерства энергетики и ЖКХ, техническая готовность объекта составляла 78 %, а на 01.07.2021 – 79 %. Такие темпы выполнения работ не позволяют завершить их в 2021 г., хотя ожидаемый срок завершения проекта, определённый министерством – 01.09.2021.

Проект «ЗАВОДной Омутнинск», реализуемый с 2020 г., в первоначально установленный срок (31.12.2020) также не был выполнен. Дополнительным соглашением с Минстроем России срок продлён до 30.09.2021. Однако администрацией г. Омутнинска нарушены и скорректированные сроки подготовки проектной документации, проведения торгов, заключения контракта и начала работ. Работы по проекту «ЗАВОДной Омутнинск» начаты 06.03.2021 с опозданием на 71 день от Графика. Объём выполненных и принятых работ на 01.07.2021 составляет 2 347 тыс. руб., а уровень готовности – всего 2,8 % от сметной стоимости. Незначительный объём выполненных работ указывает на риск невыполнения проекта к 30.09.2021 и неиспользования средств федерального бюджета.

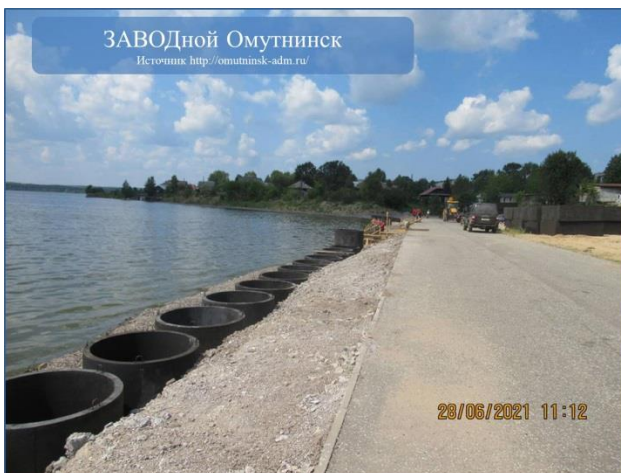

Выполнение проекта «Река времени» в г. Кирово-Чепецке также осуществляется с нарушением сроков подготовки проектной документации, проведения торгов, заключения контракта, начала работ. При плановом сроке завершения до 01.11.2021, готовность объекта к 01.07.2021 составила только 5

%. Подрядчиком по контракту стоимостью 93 678 тыс. руб. выполнены работы на сумму 2 515 тыс. руб. (2,7 %). Кроме того, за счёт внебюджетных средств проведены работы по перекладке сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Существующие темпы реализации проекта «Река времени» свидетельствуют о высоком риске невыполнения проекта в установленный срок.

Результаты мониторинга показывают, что органы местного самоуправления собственными силами не обеспечивают эффективную реализацию проектов – победителей всероссийского конкурса, создавая риски потери федерального софинансирования и дополнительных расходов областного бюджета. Учитывая, что обеспечение соблюдения графиков реализации проектов, по условиям соглашений с Минстроем России, отнесено к обязательствам Кировской области, Контрольно-счётной палатой предложено усилить контроль, методическое, консультационное сопровождение со стороны главного распорядителя средств областного бюджета (министерства строительства, энергетики и ЖКХ).

Также Контрольно-счётной палатой обращено внимание на нецелесообразность планирования реализации проектов в течение 1 финансового года при отсутствии готовой проектной документации и необходимости выполнения комплекса мероприятий, включающих значительный объём работ сезонного характера. При этом Правила предоставления средств федерального бюджета допускают возможность завершения проектов до конца года, следующего за годом получения средств. В связи с этим Контрольно-счётная палата Кировской области направила для рассмотрения в Счётную палату Российской Федерации предложения о необходимости планирования реализации и финансового обеспечения проектов – победителей всероссийского конкурса в течение 2-х финансовых лет.



Информация о результатах мониторинга с выводами и предложениями Контрольно-счётной палаты направлена в Законодательное Собрание, Губернатору Кировской области.

Мониторинг реализации проектов по развитию малых городов и исторических поселений будет продолжен Контрольно-счётной палатой в течение 2021 г.
